

Technische Daten der Anlage:

Anlagengröße: 130,29 kWp

Montagesystem: Flachdach, 20° aufgeständert mit

Gewichtsbelastung

Solarmodule: Kyocera 215 W


Anzahl der Solarmodule: 606 Stück Wechselrichter: Danfoss 15kW

Anzahl der Wechselrichter: 8 Stück

Bildergalerie:



Dachansicht mit Dachbegrünung vor der Montage

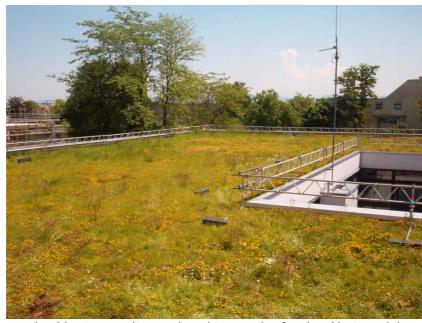

Dachansicht vor der Montage mit angebrachter umlaufender Absturzsicherung durch die Gerüstbaufirma





Treppenturm aufs Schuldach mit Schrägaufzug links



Bau der Wechselrichterplätze zwischen Stahlträgern mit Montageplatten sowie der Kabelführung auf das Schuldach in Form einer Kabelrinne auf dem darunter liegenden Schuldach





Kabelrinnenmontage auf das obere Dach zu den Solarmodulen



Wechselrichterplatz mit Aluminiumplatten zur Stabilisierung und Montage der Wechselrichter





Montage der Sicherungskästen und Überspannungsverteilung DC-seitig und der Trägerplatten für Wechselrichter



Verdrahtung der Wechselrichter und Datenleitungen zur Anlagenauswertung über das System Solar-Log





Der komplett fertig gestellte Wechselrichterplatz



Anlieferung der Dachaufständerung und der Solarmodule





Aluträgerkonstruktion für Solarmodule zur Zwischenlagerung auf unterem Dach



Anlieferung der Waschbetonplatten zur Gewichtsbelastung des Trägersystems





Anlieferung der Solarmodule im Schulhof mit dem Autokran auf das Schuldach



30 Paletten mit je 20 Solarmodulen





30 mal schwebend auf das Schuldach...



... und oben angekommen





Montage der Winkel für das Solargestell



Wir trotzen auch dem schlechten Wetter!





teilweise fertiges Gestell mit Gewichtsbelastung



Grundgestell auf Renosolplatten montiert bzw. genietet





Grundgestell und Renosolplatten mit Waschbetonplatten als Gewichtsbelastung belegt



fertiges Gestell mit Gewichtsbelastung und Granulataufschüttung





Einlegen der Solarmodule in das fertige Gestell



Vorbereitung der Solarmodule zum Einlegen in das Gestell





eingelegte Solarmodule



fertig eingelegter String





Verkabelung der Solarmodule mit speziellem Solarkabel



Weiterbau des Trägergestells, nachdem ein Drittel der Dachfläche mit Modulen belegt und verdrahtet ist





Enge Platzverhältnisse zwischen den Gestellen erfordern genaue und präzise Logistik...



... und erfolgreiche Logistik erspart viel Stress und Lauferei mit Solarmodulen.





Blick über ²/₃ der aufgebauten Solarmodule in einer Reihe auf dem Dach



Blick von oben auf die komplette Solaranlage





Wir danken der freiwilligen Feuerwehr Ostfildern-Ruit für ihre Unterstützung mit der Drehleiter bei den Fotoaufnahmen und dem Pferdehof Schanz in Ostfildern für die rasche Hilfe mit dem großen John Deere beim Versetzen und Abstellen des Trägersystems.
